Perfusion.

PROPOSITION COMMERCIALE · PREMIÈRE ESTIMATION

Un site clair pour le PSLA de Dozulé.

Le site du pôle de santé libéral ambulatoire de Dozulé. Les patients y trouvent un professionnel, un lieu, un horaire et le lien de rendez-vous. L'équipe met le site à jour elle-même, et les professionnels disposent d'un espace réservé pour leurs documents. Le tout dans un forfait unique, avec un maintien léger.

5 700 € HT

Forfait de 9,5 jours de réalisation
site public et espace professionnels
6 840 € toutes taxes comprises

Mars 2027

Ouverture indicative du site
démarrage indicatif : février 2027
cinq semaines de réalisation

149 € HT/mois

Maintien et hébergement
soit 178,80 € toutes taxes comprises
sans engagement de durée

CONTENU DU DOCUMENT

- 01 Devis
- 02 L'essentiel
- 03 Budget
- 04 Exploitation
- 05 Planning
- 06 Données de santé
- 07 Prochaines étapes
- Annexes A · B · C

Préparée pour **le PSLA de Dozulé**

Présentée par **Perfusion.dev** · Maxime Guyot
+33 6 63 33 82 95 · office@perfusion.dev · perfusion.dev

1er novembre 2026

Perfusion.

DEVIS

N° 2026-10-PSLA
Émis le 1er novembre 2026
Valable jusqu'au 30 novembre 2026

ÉMETTEUR

SARL perfusion.dev
11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage
office@perfusion.dev · +33 6 63 33 82 95

CLIENT

Société interprofessionnelle de soins ambulatoires
PSLA de Dozulé, 111 Grande Rue, 14430 Dozulé
Identité de facturation à confirmer avant contrat.

Objet : réalisation du site internet public du pôle de santé libéral ambulatoire de Dozulé et de l'espace réservé aux professionnels, formation et mise en ligne, selon le périmètre des annexes A et B.

Détail des prestations

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT
Cadrage et maquette des pages et de l'interface	1,5 jour	600,00 €	900,00 €
Socle : mise en page, comptes, hébergement	1,5 jour	600,00 €	900,00 €
Contenus : annuaire, actualités, orientation, interface	3 jours	600,00 €	1 800,00 €
Espace professionnels : documents et calendrier	2 jours	600,00 €	1 200,00 €
Recette, formation et mise en ligne	1,5 jour	600,00 €	900,00 €
Total HT	**9,5 jours**		**5 700,00 €**
TVA 20 %			1 140,00 €
Total TTC			**6 840,00 €**

Montants confirmés à l'issue du jalon 1 (cadrage). Taux de TVA en vigueur à la facturation.

Échéancier de règlement : 30 % au lancement, après signature ; 40 % à la mise à disposition du site ; 30 % à la validation de recette.

Bon pour accord

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature, précédée de la mention « Bon pour accord » :

Règlement par virement, facture à chaque jalon validé, sans escompte ; en cas de retard, pénalités au taux légal et indemnité forfaitaire de 40 € (art. L441-10 du code de commerce). Code source et dépôt Git remis au pôle ; droits d'exploitation définis au contrat. Après la mise en ligne : maintien et hébergement 149 € HT par mois (178,80 € TTC), sans engagement de durée ; nom de domaine au coût réel. Évolutions au-delà du périmètre des annexes A et B : lots séparés, chiffrés avant de commencer.
SARL perfusion.dev, capital 1 000 € · 11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage · SIREN 919 991 919 · RCS Caen · NAF 6202A · TVA intracommunautaire FR43 919991919 · office@perfusion.dev · perfusion.dev

L'essentiel en une page

Perfusion.

Le besoin

Le pôle de santé libéral ambulatoire de Dozulé se construit, avec des cabinets répartis sur plusieurs lieux. Ses patients ont besoin d'un point d'entrée unique : un site clair sur un téléphone, où trouver les professionnels, leurs coordonnées, les informations pratiques et les liens de rendez-vous. Le pôle veut aussi se présenter, annoncer ses actions de prévention, et disposer d'un espace réservé pour ses documents et son calendrier commun.

Ce que nous proposons

Un **site public simple** et un **espace réservé aux professionnels**, réunis dans un forfait unique. Peu de pages, mais les bonnes : l'annuaire, les informations pratiques, la présentation du pôle, les actualités et une page d'orientation. Une interface permet à quelques membres de l'équipe de mettre le site à jour sans compétence technique.

Nos garanties pour ce projet

- **La simplicité d'abord** : un horaire faux fait plus de tort au patient qu'une page manquante.
- **Les rendez-vous restent sur Doctolib** ou l'outil de chaque professionnel : le site affiche le lien.
- **Aucune donnée de patient** dans le site ni dans l'espace : c'est la règle qui garde le projet simple, rapide et à ce prix.

Ce que le pôle obtient

- Pour les **patients** : un annuaire par profession et par lieu, les informations pratiques, une page d'orientation qui dit qui appeler selon le besoin.
- Pour le **pôle** : une présentation de l'équipe et des projets, et des actualités tenues à jour par l'équipe elle-même.
- Pour les **professionnels** : un espace réservé avec documents partagés et calendrier commun, sans donnée de patient.

Cinq jalons, un seul prix

JALON 1

Cadrage

Pages et interface validées avant la réalisation.

JALON 2

Socle

Mise en page, comptes, hébergement.

JALON 3

Contenus

Annuaire des professionnels, actualités, orientation et mise à jour.

JALON 4

Espace

Documents partagés et calendrier commun.

JALON 5

Mise en ligne

Contenus réels, formation, ouverture.

03 · BUDGET

Un forfait clair, réglé au fil des jalons

Le budget couvre toute la demande initiale : **le site public et l'espace professionnels** (annexes A et B). Forfait réglé par jalons validés par le pôle. Montants hors taxes, TVA à 20 %.

Prestation	Charge estimée	Montant HT
Jalon 1 · Cadrage et maquette des pages et de l'interface	1,5 jour	900 €
Jalon 2 · Socle : pages, comptes, hébergement	1,5 jour	900 €
Jalon 3 · Contenus : annuaire des professionnels, actualités, page d'orientation, interface de mise à jour	3 jours	1 800 €
Jalon 4 · Espace professionnels : documents et calendrier	2 jours	1 200 €
Jalon 5 · Recette, formation et mise en ligne	1,5 jour	900 €
Total forfaitaire, dont TVA 1 140 €	**9,5 jours**	**5 700 € HT** **6 840 € TTC**

Montants confirmés à l'issue du jalon 1.

Échéancier de règlement

Jalon validé par le pôle	Part	Montant HT	Montant TTC
Lancement, après signature	30 %	1 710 €	2 052 €
Mise à disposition du site	40 %	2 280 €	2 736 €
Validation de recette	30 %	1 710 €	2 052 €
Total	**100 %**	**5 700 €**	**6 840 €**

Ce que le forfait comprend

- Le **cadrage** : maquette validée avant toute réalisation.
- La **formation** des rédacteurs et l'intégration des premiers contenus.
- La remise du **code source et du dépôt Git**.

Ce qu'il ne comprend pas

- Le **nom de domaine** : à définir, facturé au coût réel. Les abonnements de rendez-vous restent des comptes du pôle.
- Un **hébergement certifié de données de santé** : hors de ce projet (page 6).
- Les **évolutions au-delà du périmètre** : lots séparés, chiffrés avant de commencer.

04 · EXPLOITATION

Un maintien léger, sans surprise

Après la mise en ligne, la facturation tient en une seule ligne mensuelle : le **maintien du site**, hébergement compris. Sans engagement de durée : le pôle peut y mettre fin à l'issue d'un mois commencé.

Maintien et hébergement : 149 € HT par mois, soit 178,80 € TTC

Inclus dans le forfait	Ce que cela signifie pour le pôle
Hébergement du site	Le site reste en ligne, hébergé en France, avec les ressources adaptées à un site de pôle.
Certificat et sauvegardes	Connexion chiffrée, copies de secours, remise en ligne en cas d'incident.
Mises à jour de sécurité	Le site livré reste à jour, sans intervention de l'équipe.
Support en cas d'incident	Un interlocuteur attitré si le site est inaccessible ou qu'une page ne fonctionne plus. Les mises à jour de contenus restent à la charge de l'équipe, avec notre aide si besoin.

Ce que ce forfait ne couvre pas

Le forfait couvre des pages publiques et un espace sans patient : il ne comprend ni hébergement certifié de données de santé, ni astreinte de nuit. Le nom de domaine est à définir et sera facturé au coût réel, quelques euros par an. Les abonnements de rendez-vous restent ceux de chaque professionnel.

Évolutions futures

Toute évolution au-delà du site et de l'espace professionnels fait l'objet d'un **lot séparé**, chiffré et validé avant de commencer. Le forfait mensuel ne change pas sans accord.

Cinq semaines, du cadrage à l'ouverture

La réalisation s'étale sur **cinq semaines** à compter du démarrage. Les semaines précises se figent au cadrage, selon nos autres engagements et la disponibilité des textes.

Semaine	Étape	Résultat attendu
Semaine 1	Cadrage et maquette (jalon 1)	Pages, annuaire et interface validés, montant confirmé
Semaines 2 à 4	Réalisation (jalons 2, 3 et 4)	Site utilisable avec les premiers contenus, puis espace professionnels
Semaine 5	Formation et mise en ligne (jalon 5)	Rédacteurs autonomes, site ouvert au public

Repères de calendrier, indicatifs

Repère	Date indicative
Début indicatif	Février 2027, à confirmer selon nos autres projets en cours
Ouverture indicative	Mars 2027, soit cinq semaines après le démarrage

Ces repères valent sous réserve d'une signature sans tarder : un report du démarrage décale d'autant l'ouverture.

Comment nous travaillerons ensemble

- **Un interlocuteur unique** : Maxime Guyot, du cadrage à la mise en ligne.
- **La maquette d'abord** : la réalisation ne commence qu'une fois les pages validées par le pôle.
- **Les textes viennent de l'équipe** : nous les mettons en page.
- **Plusieurs lieux dès le départ** : un changement d'adresse se fait dans l'interface, sans refaire le site.
- **Des textes factuels** : horaires, accès, prévention. Pas de promesse de résultat.

Ce dont nous aurons besoin de votre côté

Une personne décisionnaire, la liste des professionnels avec l'accord de chacun pour publier ses coordonnées, les textes et photos du pôle, le plan d'accès, les liens de rendez-vous, le choix du nom de domaine, et deux ou trois personnes disponibles pour la formation.

La limite à tenir

Le site informe, il ne recueille rien sur un patient. C'est cette limite qui permet un site simple, livré vite et à ce prix. Certains prestataires présentent un hébergement certifié de données de santé comme obligatoire pour tout site de soin : il ne l'est que si le site conserve une information de santé sur une personne. Le site du pôle n'en conserve aucune, et nous n'incluons pas cet hébergement.

Dans ce site

- Annuaire, horaires, lieux, téléphones, liens de rendez-vous.
- Présentation du pôle et des projets communs.
- Annonces d'ateliers, de dépistages et de vaccinations.
- Page d'orientation, dont les soins non programmés, validée par l'équipe.
- Comptes des personnes qui mettent le site à jour.

Ce qui changerait le cadre

- Un dossier, un compte patient, un motif de consultation.
- Une prise de rendez-vous dans le site.
- Un formulaire où le patient décrit ce qu'il a.
- Une inscription nominative à un dépistage.
- Un document ou un calendrier qui cite un patient.

> **Orientation et soins non programmés**
>
> La page dit qui appeler, à quelle heure, dans quel lieu, et dans quels cas joindre le 15. Le texte est rédigé avec l'équipe et validé par elle avant la mise en ligne.

Rendez-vous

Chaque fiche peut afficher le lien vers Doctolib ou vers l'outil déjà choisi par le professionnel. L'identité du patient et le motif de consultation restent dans cet outil : le site du pôle n'en garde aucune copie. Pas de formulaire de contact non plus : les patients y décrivent souvent un symptôme. Le téléphone et les liens de rendez-vous suffisent.

Espace professionnels

L'espace est inclus dans cette proposition. Il sert à partager des documents sans nom de patient et le calendrier du pôle, avec un rappel de la règle à chaque connexion. Le jour où un fichier identifie une personne et un soin, il faut un hébergement certifié : c'est un autre projet, avec un autre budget.

Cinq décisions pour avancer

1	**Retenir le principe** : site public et espace professionnels, forfait de 5 700 € HT.
2	**Fixer le créneau de démarrage** : février 2027 (indicatif).
3	**Désigner** la personne décisionnaire et deux ou trois personnes qui mettront le site à jour.
4	**Confirmer la limite** : aucune donnée de patient, rendez-vous chez chaque professionnel.
5	**Préparer les contenus** : textes, photos, plan d'accès et liens de rendez-vous.

Récapitulatif

Sujet	Base proposée
Site et espace professionnels	9,5 jours · 5 700 € HT · 6 840 € TTC, cadrage compris
Règlement	30 % lancement · 40 % mise à disposition · 30 % validation de recette
Maintien et hébergement	149 € HT par mois (178,80 € TTC), sans engagement de durée
Nom de domaine	À définir, facturé au coût réel, hors maintien
Mise en ligne	Indicative : démarrage février 2027, ouverture mars 2027, sous réserve d'une signature sans tarder
Livrables et réversibilité	Code source et dépôt Git remis. Droits d'exploitation définis au contrat.
Données de santé	Hors périmètre. Un hébergement certifié serait un projet distinct.

Décision attendue


Valider le principe et fixer le démarrage. Le montant est confirmé à l'issue du cadrage. Le devis récapitulatif en page 1 porte le détail, les conditions et le bon pour accord.

SARL perfusion.dev, 11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage · Téléphone : +33 6 63 33 82 95 · office@perfusion.dev · Capital 1 000 €
SIREN 919 991 919 · RCS Caen · NAF 6202A · TVA intracommunautaire FR43 919991919

EXEMPLE

Un aperçu du rendu visuel

Cette maquette, préparée pour une autre structure, illustre le type de site visé : un accueil clair, la présentation du pôle, l'équipe, des conseils santé et une page de consultation.

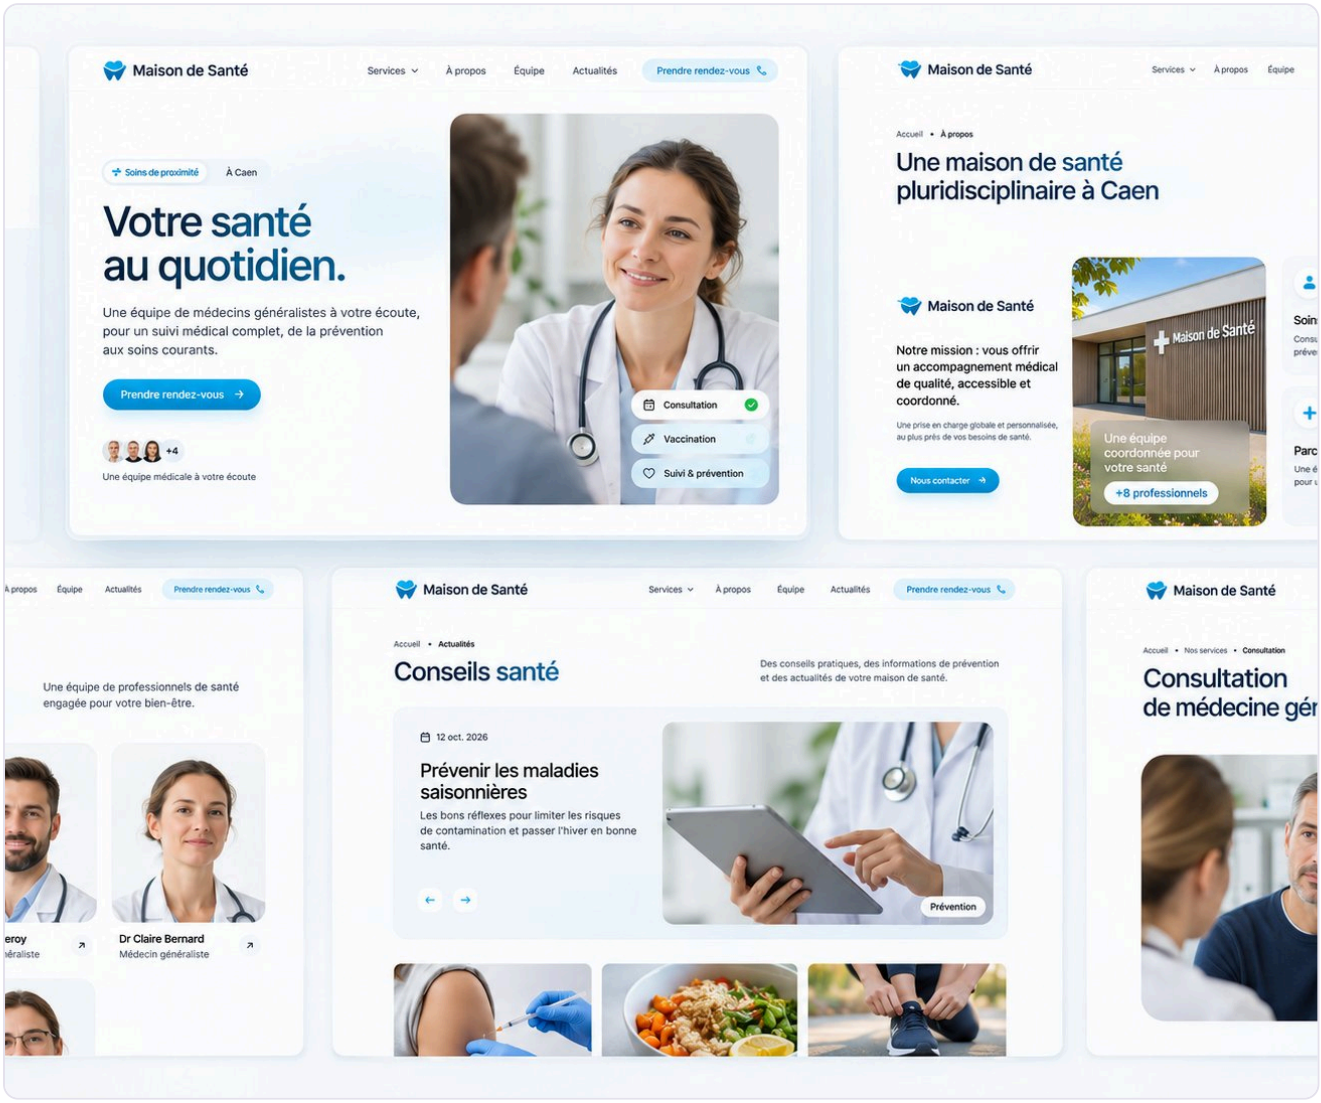

Exemple de rendu visuel, à titre indicatif. Le design final sera adapté à l'identité du PSLA de Dozulé et validé avec vous.

ANNEXE A

Périmètre du site public

Le site public du pôle, l'interface qui permet à l'équipe de le tenir à jour, et l'espace réservé aux professionnels. Le tout est prévu pour plusieurs cabinets dès le départ.

Inclus

- **Accueil et présentation** : le pôle, les professions représentées, les projets communs.
- **Annuaire** par profession et par lieu : fiche avec coordonnées, lieu de consultation, horaires, courte présentation et lien de prise de rendez-vous lorsqu'il existe.
- **Informations pratiques** : adresse, plan d'accès fourni par le pôle, stationnement, accessibilité, contacts des différents cabinets.
- **Actualités** : titre, date, texte, image, catégorie parmi atelier, dépistage, vaccination, événement ou autre.
- **Page d'orientation**, dont les soins non programmés, avec le texte validé par l'équipe.
- **Espace réservé aux professionnels** : documents partagés et calendrier commun, sans donnée de patient (annexe B).
- **Interface de mise à jour** dans le navigateur, pour quelques comptes.
- **Qualité** : affichage lisible sur téléphone, titres de pages propres, contrastes corrects.
- **Mise en ligne** sur le nom de domaine du pôle, formation courte, intégration des premiers contenus fournis.

Hors du site

- Prise de rendez-vous interne, comptes patients, formulaire de symptôme, inscription nominative.
- Rédaction des textes de santé : elle reste à l'équipe.
- Audit d'accessibilité formel, lettre d'information, application mobile à installer, autres langues.
- Hébergement certifié de données de santé, astreinte de nuit.
- Nom de domaine : à définir, facturé au coût réel. Abonnements de rendez-vous, qui restent des comptes du pôle.

Site et espace professionnels : 5 700 € HT · 6 840 € TTC · 9,5 jours

ANNEXE B

L'espace réservé aux professionnels

La demande initiale prévoit un espace réservé pour partager des documents et un calendrier commun. Il est inclus dans cette proposition, avec une règle simple : **aucun patient dans les fichiers et dans le calendrier**.

Ce que l'espace comprend

- Comptes réservés aux professionnels du pôle, avec accès nominatif.
- Dossiers de documents : dépôt, classement et téléchargement.
- Calendrier des réunions, des actions de prévention et des permanences de la structure.
- Rappel de la règle à chaque connexion : aucune information de patient.

Ce qui reste dehors

- Agendas de consultations.
- Courriers, résultats, dossiers, toute pièce qui nomme un patient.
- Messagerie de soins et synchronisation avec Doctolib.

> **Notre règle commune**
>
> L'espace n'est pas un dossier médical. Le jour où un fichier identifie une personne et un soin, il faut un hébergement certifié de données de santé : c'est un autre projet, hors de cette proposition. La règle est écrite au cadrage et rappelée à chaque connexion.

Inclus : 2 jours · 1 200 € HT · 1 440 € TTC

ANNEXE C

Points à confirmer au cadrage

Ces points se tranchent au cadrage, avant de figer le montant. Ils n'empêchent pas de fixer dès maintenant la date de démarrage.

#	Point	Effet
1	Raison sociale, numéro SIREN et adresse de facturation. Base proposée : la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, siège 111 Grande Rue, 14430 Dozulé.	Contrat, factures
2	Nom de domaine : à définir (nom retenu, registrar), facturé au coût réel.	Mise en ligne
3	Liste des professionnels, lieux, horaires, liens de rendez-vous, et accord de publication de chacun.	Annuaire
4	Deux ou trois personnes qui mettront le site à jour et suivront la formation.	Jalon 5
5	Qui rédige et qui valide les textes de présentation, de prévention et de soins non programmés.	Contenus
6	Horaires, lieux et numéros à publier pour les soins non programmés.	Page d'orientation
7	Outil de rendez-vous de chaque professionnel.	Liens des fiches
8	Photos, plan d'accès et droit de les publier.	Pages pratiques
9	Volume des premiers textes, au-delà des pages de base et de quelques actualités.	Charge du jalon 5

Prochaine étape

Fixer le créneau de démarrage. Le cadrage est compris dans le forfait de 5 700 € HT. Le montant est confirmé à la fin de ce cadrage, avant le reste de la réalisation.

Document établi le 1er novembre 2026 à partir du message de Quentin Piard du 20 octobre 2026. Montants hors taxes, TVA à 20 %. Confirmés après le cadrage. L'identité de facturation du point 1 est à vérifier avant le contrat.
